


配管检查表

检查项目的内容，若是 Yes 标上“○”，若是 No 则标上“×”之后检查。
 ※如果在试运行时发生故障，请务必确认带记号的项目。

★所连接的驱动设备可能会动作。
 动作时请注意避免损坏夹具及设备。

- 整体系统
- 使用后第几年？（ 年 个月）
- ※气缸动作
 - ※作动中供给压力未下降 0.1MPa 以上

- [负载、导轨]
- ※配备浮动机构
 - ※导轨部未偏离中心
 - 无负载变化
- 确认最低作动压力
 (在 MPa 时开始作动)

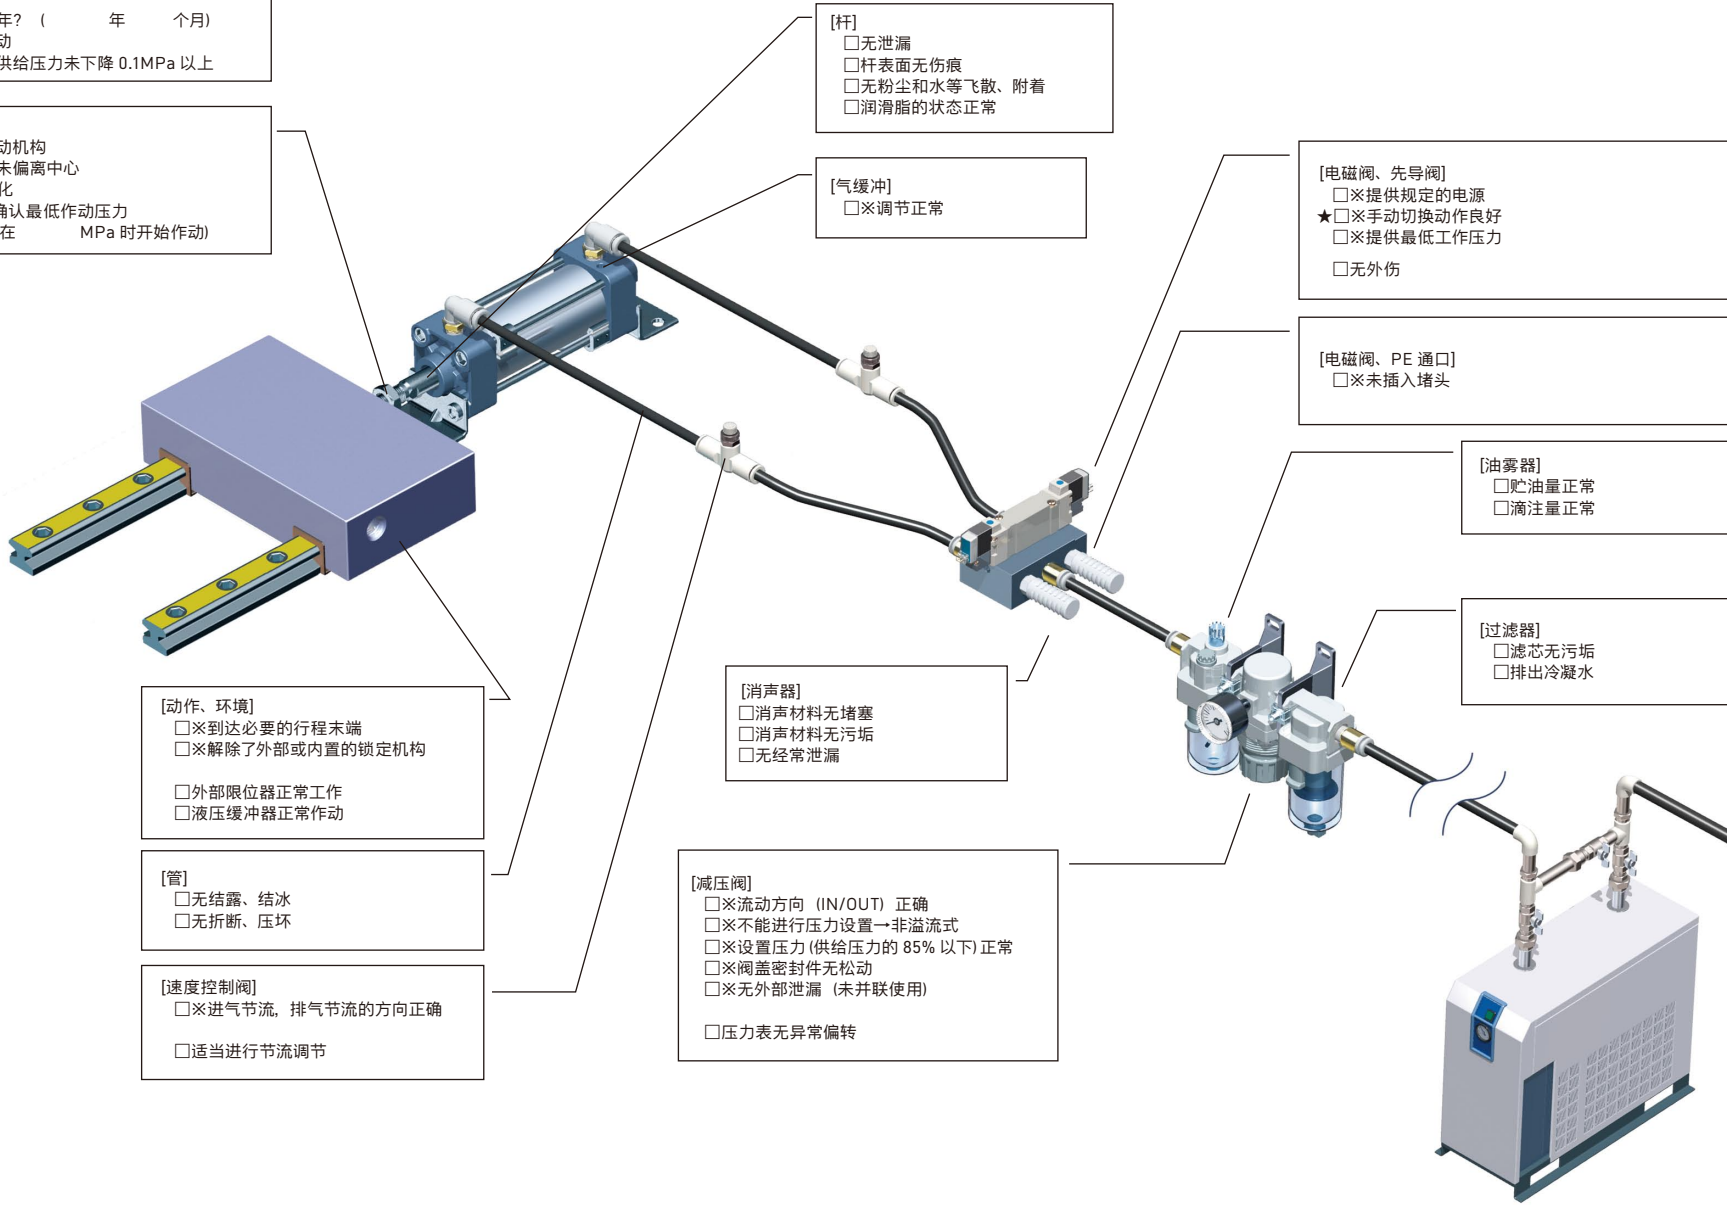

- [杆]
- 无泄漏
 - 杆表面无伤痕
 - 无粉尘和水等飞散、附着
 - 润滑脂的状态正常

- [气缓冲]
- ※调节正常

- [电磁阀、先导阀]
- ※提供规定的电源
 - ★ ※手动切换动作良好
 - ※提供最低工作压力
 - 无外伤

- [电磁阀、PE 通口]
- ※未插入堵头

- [油雾器]
- 贮油量正常
 - 滴注量正常

- [过滤器]
- 滤芯无污垢
 - 排出冷凝水

- [动作、环境]
- ※到达必要的行程末端
 - ※解除了外部或内置的锁定机构
 - 外部限位器正常工作
 - 液压缓冲器正常作动

- [管]
- 无结露、结冰
 - 无折断、压坏

- [速度控制阀]
- ※进气节流，排气节流的方向正确
 - 适当进行节流调节

- [消声器]
- 消声材料无堵塞
 - 消声材料无污垢
 - 无经常泄漏

- [减压阀]
- ※流动方向 (IN/OUT) 正确
 - ※不能进行压力设置→非溢流式
 - ※设置压力 (供给压力的 85% 以下) 正常
 - ※阀盖密封件无松动
 - ※无外部泄漏 (未并联使用)
 - 压力表无异常偏转
